


3. จัดแบ่งโซนบริการรูปแบบใหม่
แผนพัฒนาภาพ ปี 2566-2570

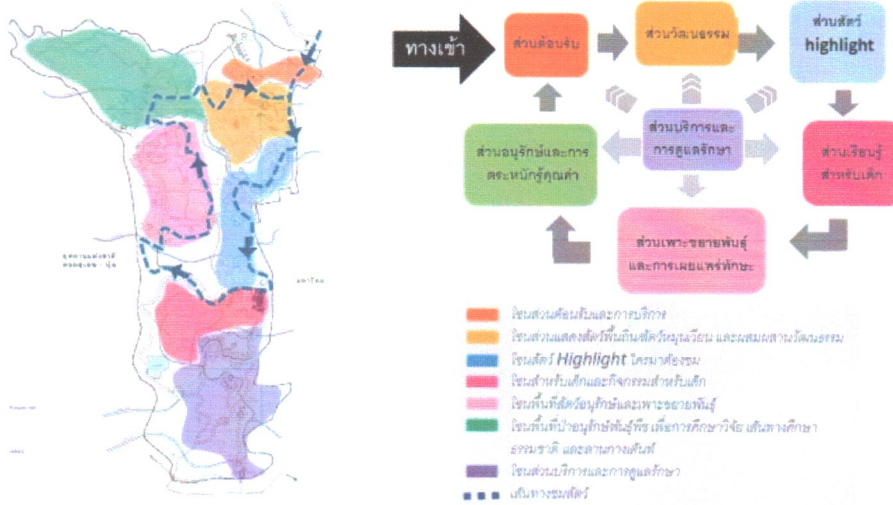

แผนระยะสั้น

พัฒนาส่วนต้อนรับและจุด Highlight

The diagram shows a map of service zones on the left and a table on the right. The map highlights the 'ทางเข้า' (Entrance) and 'ส่วนต้อนรับ' (Reception) areas. The table below provides details for three projects:

แผนงานโครงการ	ระยะสั้น		งบประมาณ	ทรัพยากรที่จะ
	2566	2567		
1 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการต้อนรับ เพื่อสัตว์ อุทยาน	✓		29,183,900	บุคลากรโซน อุทยาน
2 พัฒนาศูนย์รับเลี้ยง สัตว์เลี้ยง		✓	24,280,000	พัฒนาบุคลากรโซน อุทยาน
3 พัฒนาศูนย์รับเลี้ยง สัตว์เลี้ยง		✓	10,300,000	พัฒนาบุคลากรโซน อุทยาน

๕.๕.๕ ความเชื่อมโยงของโครงการกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ



(นางสาวไพโรรินทร์ ยานะ)





.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินดีรส)

ประเภท : 4. อาคารให้บริการ

รายการตรวจสอบ โครงการพัฒนาอาคารส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ลำดับ	ประเภท	ปริมาณ/จำนวน	สภาพปัญหาและผลกระทบ	การประเมินความคุ้มค่าด้านการเงิน/สังคม	ภาพประกอบ
1	อาคารต้อนรับ	- 1 อาคาร - ห้องสุขา 20 จุด	- อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ส่วนสำนักงาน ส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว และส่วนลานจอดรถ ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 15 ปี จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสวนสัตว์ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสวนสัตว์ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสวนสัตว์ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก - อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่เป็นการสร้างมลพิษภายในพื้นที่ จึงทำให้อาคารเสื่อมสภาพ เช่น ฉีกทึบโดยสารมีสีงาน ความเสียหายภายนอกอาคาร ระบบประปา-สุขาภิบาลห้องสุขา อุปกรณ์ภายในห้องสุขา เป็นต้น - จาการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้พิการ คนชรา เด็ก เช่น ของจอดรถสำหรับผู้พิการ/คนชรา ห้องสุขาสำหรับเด็ก	1.ความคุ้มค่าด้านการเงิน 1.1 อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว และส่วนลานจอดรถ สามารถรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ปีละไม่น้อยกว่า 3,338,087 บาทต่อปี (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ปี 63-65) 1.2 การปรับปรุงส่วนต้อนรับให้มีพื้นที่บริการร้านค้า อาหาร และเครื่องดื่ม รวมไปถึงของที่ระลึก จะสร้างรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี ประเมินการเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นต่อปีจำนวน 250,000 บาท	 ภาพความเสื่อมโทรมภายนอกอาคาร  ภาพฉีกทึบโดยสารมีสีสำนักงาน

ลำดับ	ประเภท	ปริมาณ/จำนวน	สภาพปัญหาและผลกระทบ	การประเมินความคุ้มค่าด้านการเงิน/สังคม	ภาพประกอบ
			- ไม่มีป้ายจราจรบนอาคารจอดรถ และลูกศรบนพื้นทางไม่ชัดเจน - ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดการจัดจราจรภายในอาคารจอดรถ จึงควรมีระบบนิบรตและแสดงจำนวนรถบนอาคารจอดรถ - การจัดวางพื้นที่ส่วนต้อนรับ เป็นจุดยับ จุดประชาสัมพันธ์ไม่เด่นชัดทำให้มีนักท่องเที่ยวคู่มือกว่าจุดบริการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่ที่ใด และสับสนว่าต้องเข้าสวนสัตว์ทางใด - เส้นทางเดินรถนักท่องเที่ยว ทับซ้อนเส้นทางเดินคนทำให้เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว	2.ความคุ้มค่าทางสังคม 2.1 สร้างช่องจอดรถราจที่ เหมาะสมสำหรับผู้พิการ สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็ม 2.2 เกษมภาครฐานการศึกษา ความปลอดภัยในการเดินทาง ลิฟต์โดยสาร	  ภาพห้องสุขาที่ชำรุดเสียหาย  ภาพไม่มีป้ายจราจรบนอาคารจอดรถ  ภาพพื้นที่ส่วนต้อนรับ

จากการตรวจสอบสภาพของอาคารในปัจจุบันส่งผลให้การบริการและภาพลักษณ์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้สวนสัตว์เชียงใหม่มีมาตรฐานทันสมัยสู่สวนสัตว์ชั้นนำของ ประเทศ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ

(นางสาวไพรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินศิริส)

๕.๕.๖ รายการประเภทอาคารและประเมินความเสี่ยง (Checklist)

การประเมินความเสี่ยงหากไม่มีการปรับปรุง โครงการพัฒนาอาคารส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ลำดับ	ประเภท	5	4	3	2	1	หมายเหตุ
1	ความเสี่ยงด้านโครงสร้างความแข็งแรงของอาคาร				✓		
2	ความเสี่ยงด้านการใช้งานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร	✓					- เนื่องจากอาคารใช้งานมาเป็นระยะกว่า 14 ปี และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้อุปกรณ์ประกอบอาคารชำรุดเสื่อมโทรม (เช่น ลิฟต์โดยสาร อุปกรณ์ภายในห้องสุขา) - พื้นที่ส่วนแรกรับและจุดจำหน่ายบัตร สับสน ทำให้ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการยาก
3	ความเสี่ยงด้านระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย					✓	
4	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย เช่น ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ	✓					- ระบบประปา-สุขาภิบาล ห้องสุขาอุดตัน และอุปกรณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ทำให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ - เส้นทางเดินรถภายในอาคารจอดรถสับสน เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการ

* 5 เสี่ยงมากที่สุด, 1 เสี่ยงน้อยที่สุด

จากการประเมินความเสี่ยงหากไม่มีการปรับปรุงโครงการดังกล่าว จะไม่สามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ว่า “พัฒนาคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าในภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีมาตรฐานทันสมัยสู่สวนสัตว์ชั้นนำของประเทศ”

๖. แบบประกอบการเสนอโครงการ

๖.๑ แนวคิดในการออกแบบ

แบ่งเป็น ๒ ส่วน

- ส่วน City Zoo พัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ในเมืองที่มีเทคโนโลยีส่วนหน้าให้ทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานอาคาร และลดค่าใช้จ่ายกำลังคนในการดูแลพื้นที่ เช่น ระบบการนั้บรรดและแสดงจำนวนที่จอดรถ, ตู้ kiosk ให้ข้อมูลสวนสัตว์

- ส่วน Culture Zoo การออกแบบอาคารส่วนหน้า และภายในอาคาร ที่เคารพธรรมชาติหรือกลมกลืนธรรมชาติ, มีกลิ่นอายความเป็นล้านนาที่ทันสมัย

คณะกรรมการร่างขอเนเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ

(นางสาวไพรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินดีรส)

CITY ZOO

- เทคโนโลยี
- ความทันสมัย
- การส่งสารถึงผู้บริโภคได้ง่าย
- Visiting Route



CULTURE ZOO

- การออกแบบที่เคารพธรรมชาติ
- ลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายล้านนา
- การออกแบบที่เหมาะสมกับเขตร้อนชื้น (tropical design architecture) เพื่อการประหยัดพลังงาน
- เน้นการใช้วัสดุที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านการใช้วัสดุรีไซเคิล
- การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน



ภาพแสดงแนวคิดในการพัฒนา

๖.๒ แผนที่โครงการ (แสดงตำแหน่งระดับ Contour และเส้นทางเข้าออกโครงการ)

๖.๓ ผังบริเวณ (แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่จะก่อสร้าง และเส้นชั้นความสูง)

๖.๔ แพลนพื้นที่

๖.๕ รูปด้าน

๖.๖ รูปตัด (ถ้ามี)

๖.๗ ทัศนียภาพโครงการ

๖.๘ ภาพประกอบการออกแบบ (ถ้ามี)

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ


(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ


(นางสาวไพโรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินดีรส)

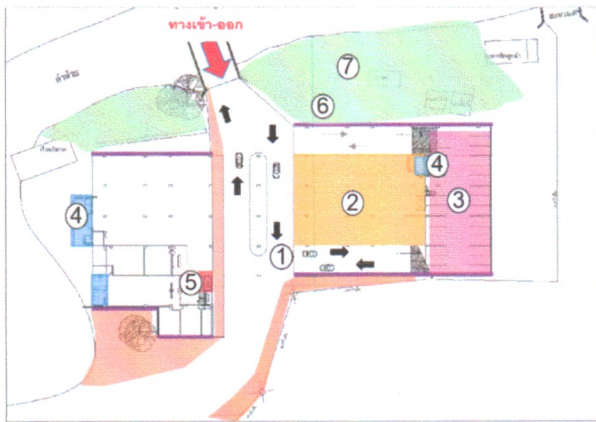

1. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ และการปรับปรุงของนันทนาการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงพื้นที่โถงภายในชั้น ๓ ประกอบด้วย จุดไฟส่องสว่างบนนักท่องเที่ยว, จำนวนบัตรประชาชนส่วนต่อเติม และจัดให้เป็นลานจำหน่ายสินค้าจากบ้านค้าชั้นนำ
3. ติดตั้งระบบบันได และแสดงจำนวนในพื้นที่จอดรถ จำนวน 5 ชั้น พร้อมติดตั้งป้ายไฟบอกเส้นทางภายในอาคารส่วนกลางจอดรถ และพื้นที่เป็นจราจรพื้นทาง
4. ปรับปรุงห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 20 จุด
5. ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร โยธาสำนักงาน จำนวน 2 จุด
6. งานตกแต่งภายในอาคาร เพื่อให้มีบรรยากาศแบบธรรมชาติ และลดทอนความแข็งของตัวอาคาร เพื่อเพิ่มสีสันแก่อาคาร
7. งานตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม

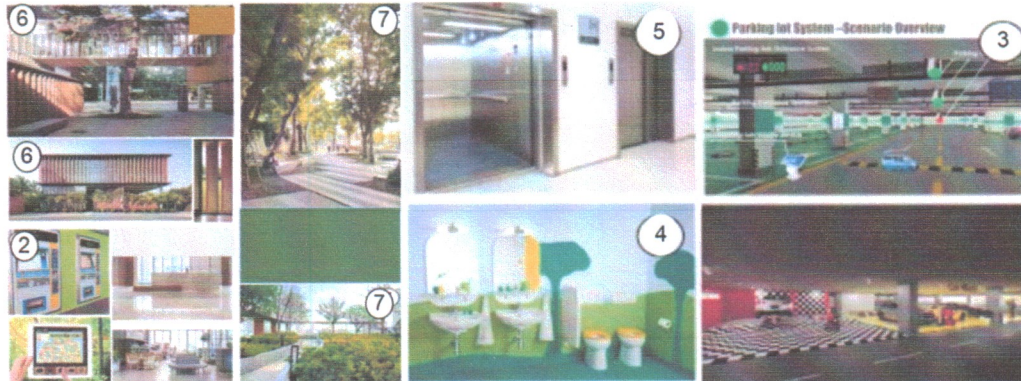

ผังบริเวณและภาพประกอบการออกแบบ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ
(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ
(นางสาวไพโรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ
(นายเดชภาธร ยินดีรส)

๗. สถานที่ดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดงาน จำนวน ๗ งวดงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน ตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ

(นางสาวไพโรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินศิริส)

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๐.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบกับเกณฑ์อื่น

๑๐.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

องค์ประกอบในการพิจารณา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอมีข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วนตามคุณลักษณะตามประกาศ
๓. คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

ตัวแปรที่ ๑ การพิจารณาราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๓๐

ตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาด้านคุณภาพ ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๗๐

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียด ดังนี้

๑. ความเหมาะสมของผู้ประกอบการ น้ำหนักร้อยละ ๑๐

- พิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อมในการลงทุน ขีดกำลังความสามารถในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล/ผลงานที่ผ่านมาและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑ ศักยภาพ ความพร้อมในการลงทุน ผลงานด้านประสบการณ์และผลการดำเนิน โครงการ (พร้อมแนบเอกสารแสดงความพร้อมในการลงทุนและหนังสือรับรองผลงานการแล้วเสร็จของงาน)

๑.๒ บุคลากร

๒. การวางแผนและการจัดองค์กร น้ำหนักร้อยละ ๒๐

- พิจารณาจากการวางแผนในการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอ ผังบุคลากร และคุณสมบัติวิศวกร และบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินงานที่เหมาะสมกับโครงการ รวมทั้งเครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้โครงการ เพื่อใช้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

๒.๑ แผนงานก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้าง

๒.๒ แผนกำลังคน/เครื่องจักร

๒.๓ แผนการส่งแบบ Shop drawing และขออนุมัติวัสดุ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ

(นางสาวไพรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินดีรส)

๓. การบริหารโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ น้ำหนักร้อยละ ๒๐

- พิจารณาจากการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการจราจร การนำเสนอแผนการควบคุมงาน การควบคุมคุณภาพงาน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานได้รับรองการผลิตจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพของงาน

๓.๒ แผนการบริหารจัดการและการดูแลรักษาพรรณไม้เดิมภายในพื้นที่โครงการ

๓.๓ แผนการจัดกรจราจรและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๔. การพัฒนารายละเอียดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพงาน น้ำหนักร้อยละ ๒๐

- พิจารณาจากการนำเสนอการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานได้รับรองการผลิตจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- พิจารณาจากการนำเสนอการพัฒนารายละเอียดการออกแบบ ภายใต้วัตถุประสงค์ระยะเวลาให้แล้วเสร็จ การพัฒนารายละเอียดการออกแบบหรือกรอบแนวคิดภาพรวมของการวางผังแบบแปลน เช่น การจัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และแนวแบ่งกันจัดสัดส่วนพื้นที่ทำงาน การตกแต่งบรรยากาศ และความคุ้มค่าในการใช้งบค่าก่อสร้าง

๑.๑ คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

- การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานหรือเป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่

๑. เครื่องหมายฉลากเขียว

๒. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๓. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO)

๔. จดทะเบียนผลิตภัณฑ์

๕. วัสดุที่ผลิตในประเทศ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ

(นางสาวไพรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินศิริส)

๑.๒ คุณภาพตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่นำไปใช้ในโครงการ

- การเสนอเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างและการเสนอครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้รับมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
- การนำเสนอแบบ ๓D Perspective จำลองภาพการตกแต่งภายในอาคาร และลานกิจกรรม รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ พร้อมแบบแปลนรายละเอียดสอดคล้องกับรูปแบบรายการหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม และคุณลักษณะวัสดุ ตลอดจนสีที่ใช้ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน มีความทันสมัยและบรรยากาศที่เอื้อต่อการสนับสนุนผู้ใช้บริการจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและดูแลรักษาง่าย
- สวนสัตว์เชียงใหม่ กำหนดขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอเพื่อตัดสินคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอ “ข้อเสนอทางเทคนิค” ตามข้อพิจารณาตัวแปรที่ ๒ โดยผู้ที่ยื่นข้อเสนอต้องได้รับคะแนนรวมของตัวแปรที่ ๒ การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ ข้อเสนอทางเทคนิค ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา “การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๑)

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายราย สวนสัตว์เชียงใหม่ จะพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดจากเกณฑ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หากดำเนินการแล้วไม่อาจชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ำสุดในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๒. สวนสัตว์เชียงใหม่ ไม่จำกัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ หากมีความประสงค์จะเสนอแบบรายละเอียดงาน หรือแบบพัฒนารายละเอียดรูปแบบ การออกแบบ หรือรายการประกอบแบบหรือการเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าทั้งรายการวัสดุ ผลิตภัณฑ์ชุดสำเร็จรูปจากชุดรูปแบบรายการและคุณภาพเฉพาะ ซึ่งแสดงไว้ในแบบประกอบเอกสารขอบเขตงานเพื่อสนับสนุนประโยชน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและความสัมฤทธิ์ผลของโครงการทั้งในด้านมาตรฐานและวิธีการก่อสร้างตกแต่งคุณภาพงานตกแต่ง ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้วัสดุ ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ของเขตงาน กรอบราคาค่าก่อสร้างโครงการ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ
(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ
(นางสาวไพโรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ
(นายเดชภาธร ยินศิริส)

สวนสัตว์เชียงใหม่ สงวนสิทธิ์มิได้มีเงื่อนไขผูกมัดต่อภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอและมิได้มีเงื่อนไขผูกมัดในการพิจารณายอมรับหรือเห็นชอบต่อผลการนำเสนอดังกล่าวของผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา

ทั้งนี้หากภายหลังผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาจ้างเหมาโครงการนี้ รายการงานและระดับคุณภาพผลงานในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ที่เสนอมาพร้อมข้อเสนอด้านเทคนิคจากผู้ยื่นข้อเสนอรวมถึงความรับผิดชอบในแบบที่มีการพัฒนาปรับแก้ไขโดยวิศวกรที่ลงนามรับรองในแบบชุดของผู้ยื่นข้อเสนอ สวนสัตว์เชียงใหม่จะนับรวมเป็นสาระ รายการและความรับผิดชอบในผลงานแบบของขอบเขตงานแบบท้ายสัญญาจ้างเหมาโดยผู้เสนองานหรือภายหลังเป็นคู่สัญญาไม่สามารถเรียกร้องผลตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมสำหรับส่วนงานดังกล่าวจากสวนสัตว์เชียงใหม่ได้อีก

๑๑. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ซึ่งความชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

๑๒. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

งบประมาณในการจ้างก่อสร้างดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)

๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ

(นางสาวไพโรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินศิริส)

๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงบประมาณ และในกรณีที่สวนสัตว์ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง สวนสัตว์สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ (๑)

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจัยรณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจัยรณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่
- E-mail : nillapan@zoothailand.org
- สถานที่ติดต่อ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่
- โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๑๑๓๙ ต่อ ๑๓๑-๑๓๖
- เว็บไซต์ <http://www.zoothailand.org>, [http:// www.chiangmai.zoothailand.org](http://www.chiangmai.zoothailand.org) / และ <http://www.gprocurement.go.th>
- สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัยรณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจัยรณ์ หรือมีความเห็นด้วย

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ชิตมินทร์)

.....กรรมการ

(นางสาวไพโรรินทร์ ยานะ)

.....กรรมการ

(นายเดชภาธร ยินดีรส)
